Sportpark Bergholz
"sports unlimited"
GESAMTTERMINPLAN 15.11.09

SPORTPARK BERGHOLZ
mit Planungskredit

Implenia
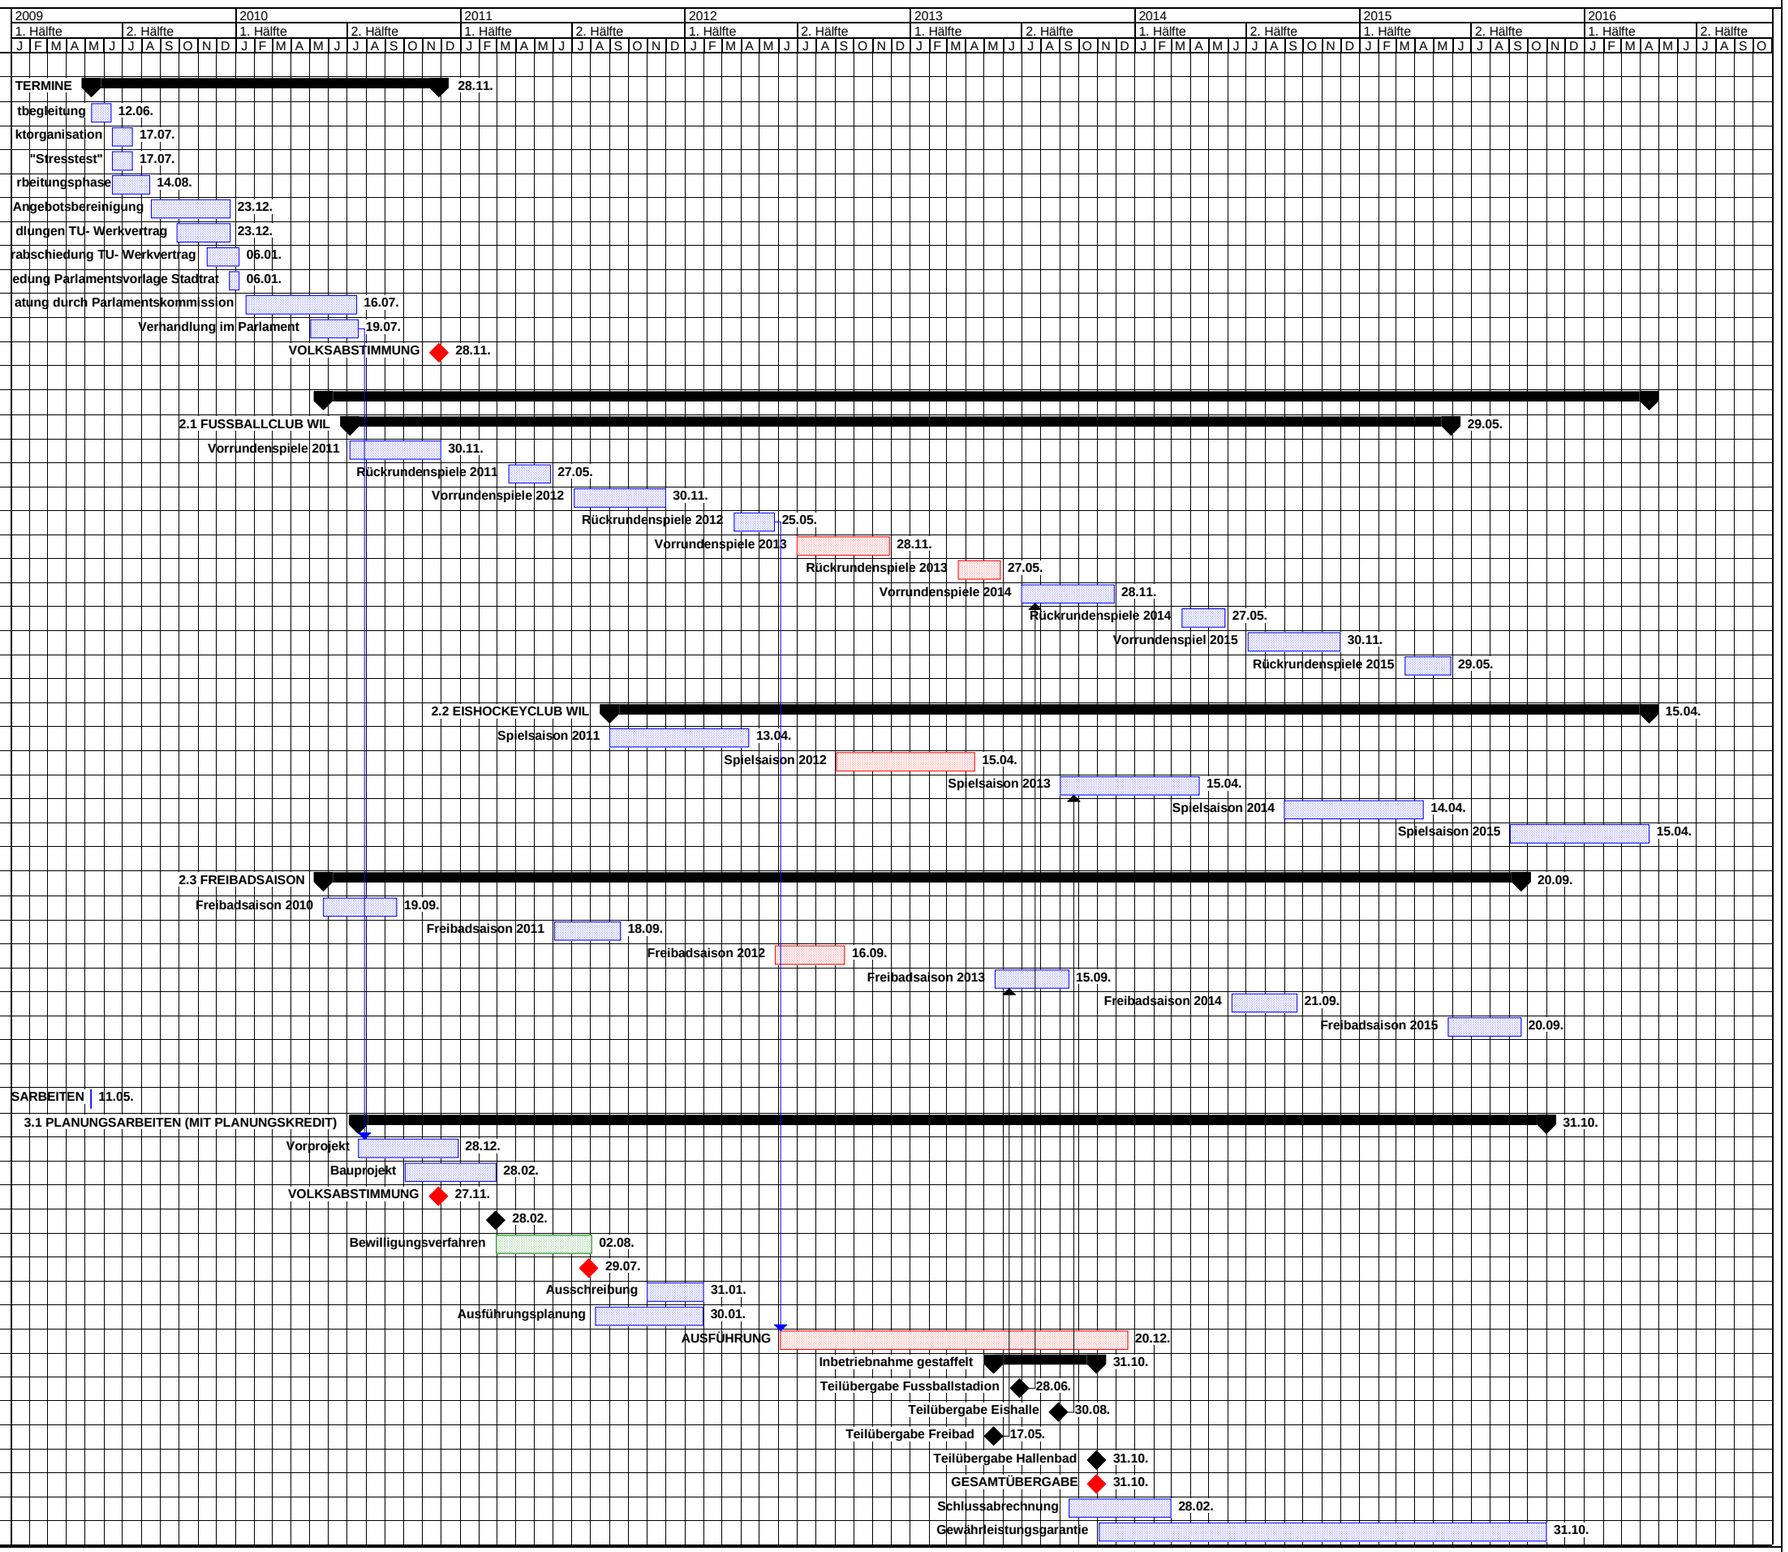
Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1			
2	**1. BEHÖRDENTERMINE**	TERMINE	28.11.
3	Wahl externe Projektbegleitung	tbegleitung	12.06.
4	Aufbau einer Projektorganisation	ktorganisation	17.07.
5	"Stresstest"	"Stresstest"	17.07.
6	Konditionsverhandlungen Implenia GU AG Überarbeitungsphase	rbeitungsphase	14.08.
7	Projekt- und Angebotsbereinigung	Angebotsbereinigung	23.12.
8	Verhandlungen TU- Werkvertrag	dlungen TU- Werkvertrag	23.12.
9	Verabschiedung TU- Werkvertrag	rabschiedung TU- Werkvertrag	06.01.
10	Verabschiedung Parlamentsvorlage Stadtrat	edung Parlamentsvorlage Stadtrat	06.01.
11	Beratung durch Parlamentskommission	atung durch Parlamentskommission	16.07.
12	Verhandlung im Parlament	Verhandlung im Parlament	19.07.
13	**VOLKSABSTIMMUNG**	VOLKSABSTIMMUNG	28.11.
14			
15	**2. VEREINSSAISONZEITEN**		
16	**2.1 FUSSBALLCLUB WIL**	2.1 FUSSBALLCLUB WIL	29.05.
17	Vorrundenspiele 2011	Vorrundenspiele 2011	30.11.
18	Rückrundenspiele 2011	Rückrundenspiele 2011	27.05.
19	Vorrundenspiele 2012	Vorrundenspiele 2012	30.11.
20	Rückrundenspiele 2012	Rückrundenspiele 2012	25.05.
21	Vorrundenspiele 2013	Vorrundenspiele 2013	28.11.
22	Rückrundenspiele 2013	Rückrundenspiele 2013	27.05.
23	Vorrundenspiele 2014	Vorrundenspiele 2014	28.11.
24	Rückrundenspiele 2014	Rückrundenspiele 2014	27.05.
25	Vorrundenspiel 2015	Vorrundenspiel 2015	30.11.
26	Rückrundenspiele 2015	Rückrundenspiele 2015	29.05.
27			
28	**2.2 EISHOCKEYCLUB WIL**	2.2 EISHOCKEYCLUB WIL	15.04.
29	Spielsaison 2011	Spielsaison 2011	13.04.
30	Spielsaison 2012	Spielsaison 2012	15.04.
31	Spielsaison 2013	Spielsaison 2013	15.04.
32	Spielsaison 2014	Spielsaison 2014	14.04.
33	Spielsaison 2015	Spielsaison 2015	15.04.
34			
35	**2.3 FREIBADSAISON**	2.3 FREIBADSAISON	20.09.
36	Freibadsaison 2010	Freibadsaison 2010	19.09.
37	Freibadsaison 2011	Freibadsaison 2011	18.09.
38	Freibadsaison 2012	Freibadsaison 2012	16.09.
39	Freibadsaison 2013	Freibadsaison 2013	15.09.
40	Freibadsaison 2014	Freibadsaison 2014	21.09.
41	Freibadsaison 2015	Freibadsaison 2015	20.09.
42			
43			
44	**3. PLANUNGSARBEITEN**	SARBEITEN	11.05.
45	**3.1 PLANUNGSARBEITEN (MIT PLANUNGSKREDIT)**	3.1 PLANUNGSARBEITEN (MIT PLANUNGSKREDIT)	31.10.
46	Vorprojekt	Vorprojekt	28.12.
47	Bauprojekt	Bauprojekt	28.02.
48	**VOLKSABSTIMMUNG**	VOLKSABSTIMMUNG	27.11.
49	Baueingabe		28.02.
50	Bewilligungsverfahren	Bewilligungsverfahren	02.08.
51	**BAUBEWILLIGUNG (OHNE EINSPRACHEN)**		29.07.
52	Ausschreibung	Ausschreibung	31.01.
53	Ausführungsplanung	Ausführungsplanung	30.01.
54	**AUSFÜHRUNG**	AUSFÜHRUNG	20.12.
55	**Inbetriebnahme gestaffelt**	Inbetriebnahme gestaffelt	31.10.
56	**Teilübergabe Fussballstadion**	Teilübergabe Fussballstadion	28.06.
57	**Teilübergabe Eishalle**	Teilübergabe Eishalle	30.08.
58	**Teilübergabe Freibad**	Teilübergabe Freibad	17.05.
59	**Teilübergabe Hallenbad**	Teilübergabe Hallenbad	31.10.
60	**GESAMTÜBERGABE**	GESAMTÜBERGABE	31.10.
61	Schlussabrechnung	Schlussabrechnung	28.02.
62	Gewährleistungsgarantie	Gewährleistungsgarantie	31.10.
